Gare 7 bis · Le métré sur plan

Réseau inerWeb BE · exercice papier

Nom, prénom :


Classe : Date :

Exercice papier : le métré du bâtiment B

Bâtiment B : deux niveaux, toiture-terrasse, cotes en millimètres. Coupe : 2500 sous plafond, plancher de 200. Écrivez chaque calcul avec son unité ; calculatrice autorisée.

1. Les murs de la salle (gare, écrans 3 à 7)

inerweb.fr/b/?p7b-1

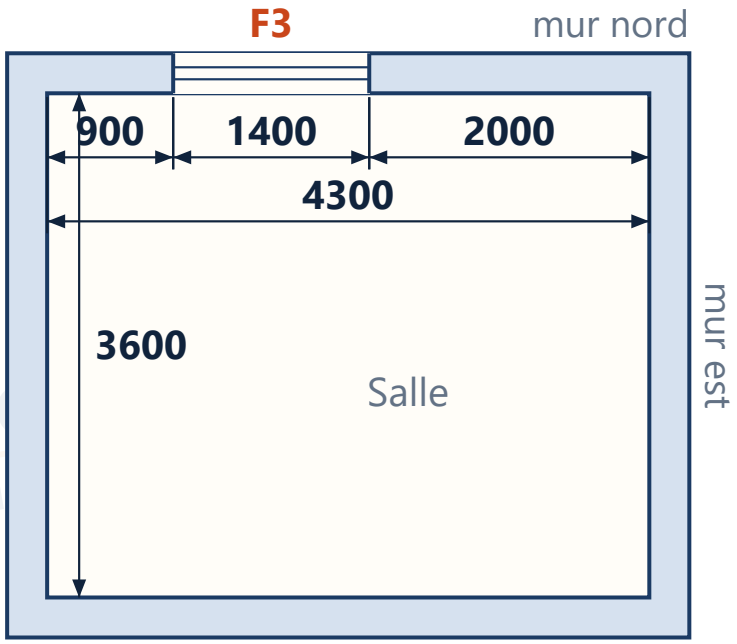


Plan de la salle, à l'étage. Cotes intérieures en millimètres.

Fenêtre	Largeur × hauteur (mm)	Mur
F3	1400 × 1100	nord

Murs à doubler : nord et est. Le mur est mesure 3600, sans ouverture.

Mur	Longueur (m)	Hauteur (m)	Brute (m²)	Ouvertures (m²)	Nette (m²)
nord					
est					
Total net des deux murs					

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

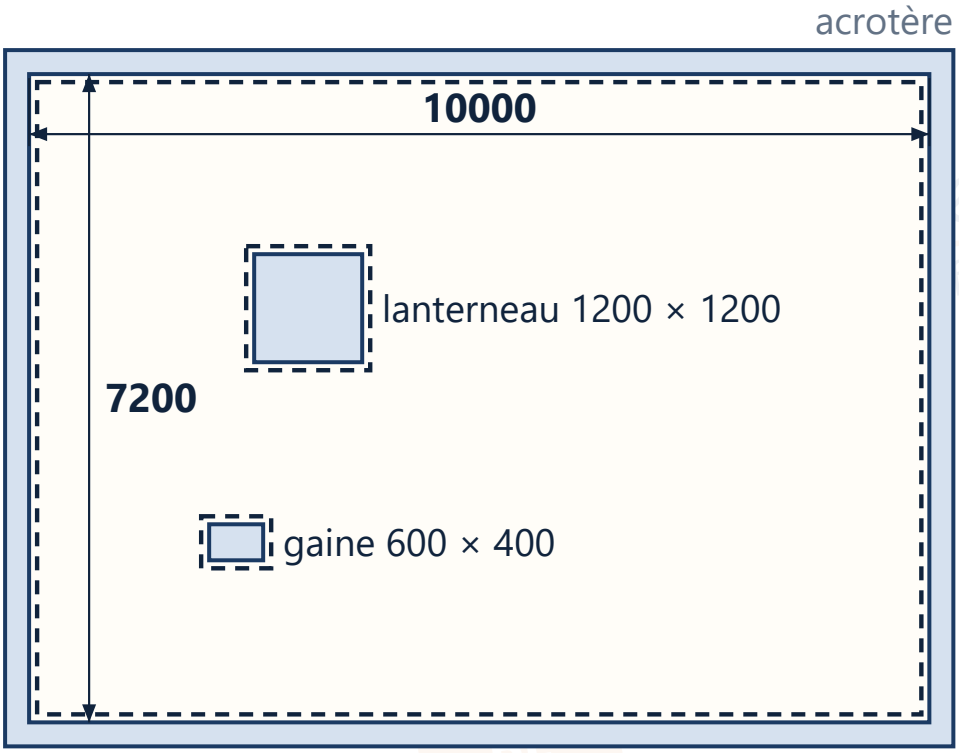

Tireté : le relevé.

Plan de toiture du bâtiment B. Cotes en millimètres.


Hauteur développée du relevé, lue sur le détail de l'acrotère : 250 mm.

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Surface brute		
Émergences		
Surface nette		
Relevé des acrotères		
Relevé des émergences		
Relevé total		
Surface de relevé		

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.

3. Le réseau d'eau (gare, écran 11)

inerweb.fr/b/?p7b-3

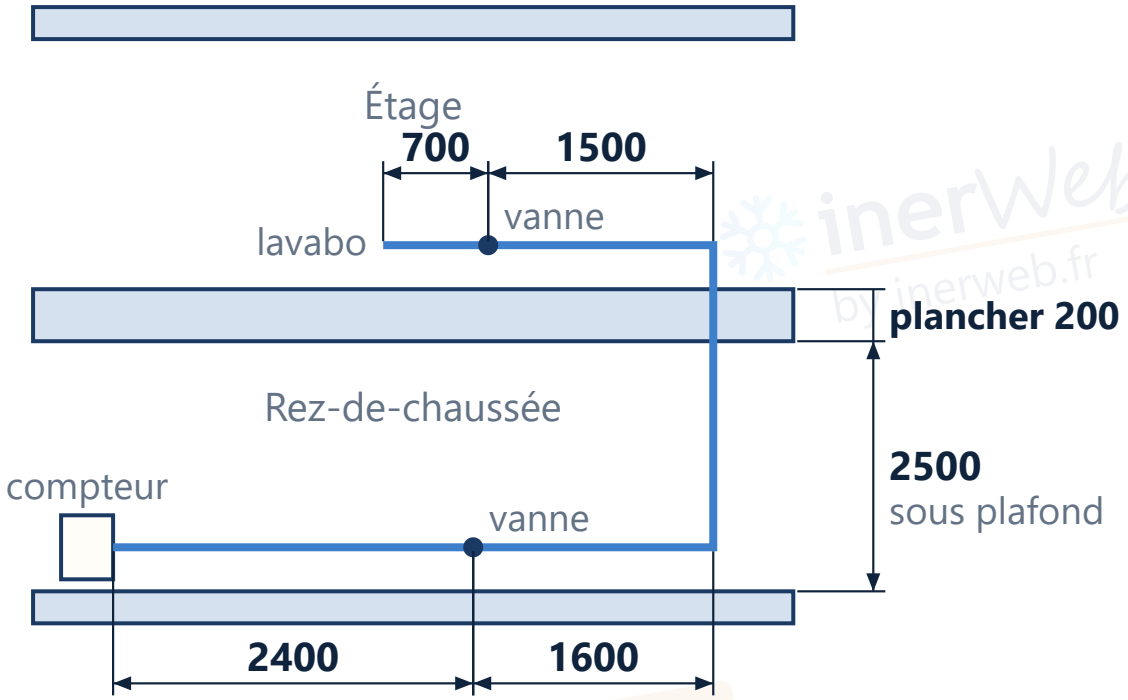

Élévation du mur. Les deux parcours sont à la même hauteur au-dessus de leur sol. Cotes en millimètres.

Morceau	Calcul	Longueur (m)
Rez-de-chaussée		
Montée		
Étage		
Longueur totale		

4. Les volumes (gare, écran 13)

inerweb.fr/b/?p7b-4

Ce que vous calculez	Calcul	Résultat
Volume de la salle		
Isolant de 100 mm sur la toiture nette		

© inerWeb 2026, F. Henninot · inerweb.fr · Licence CC BY-NC-ND 4.0 : citer inerWeb, pas d'usage commercial, pas de diffusion d'adaptations.
